Harmonogram stavby: 0000 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Zhotovitel: WELLCON Brno s.r.o.

60230 Brno
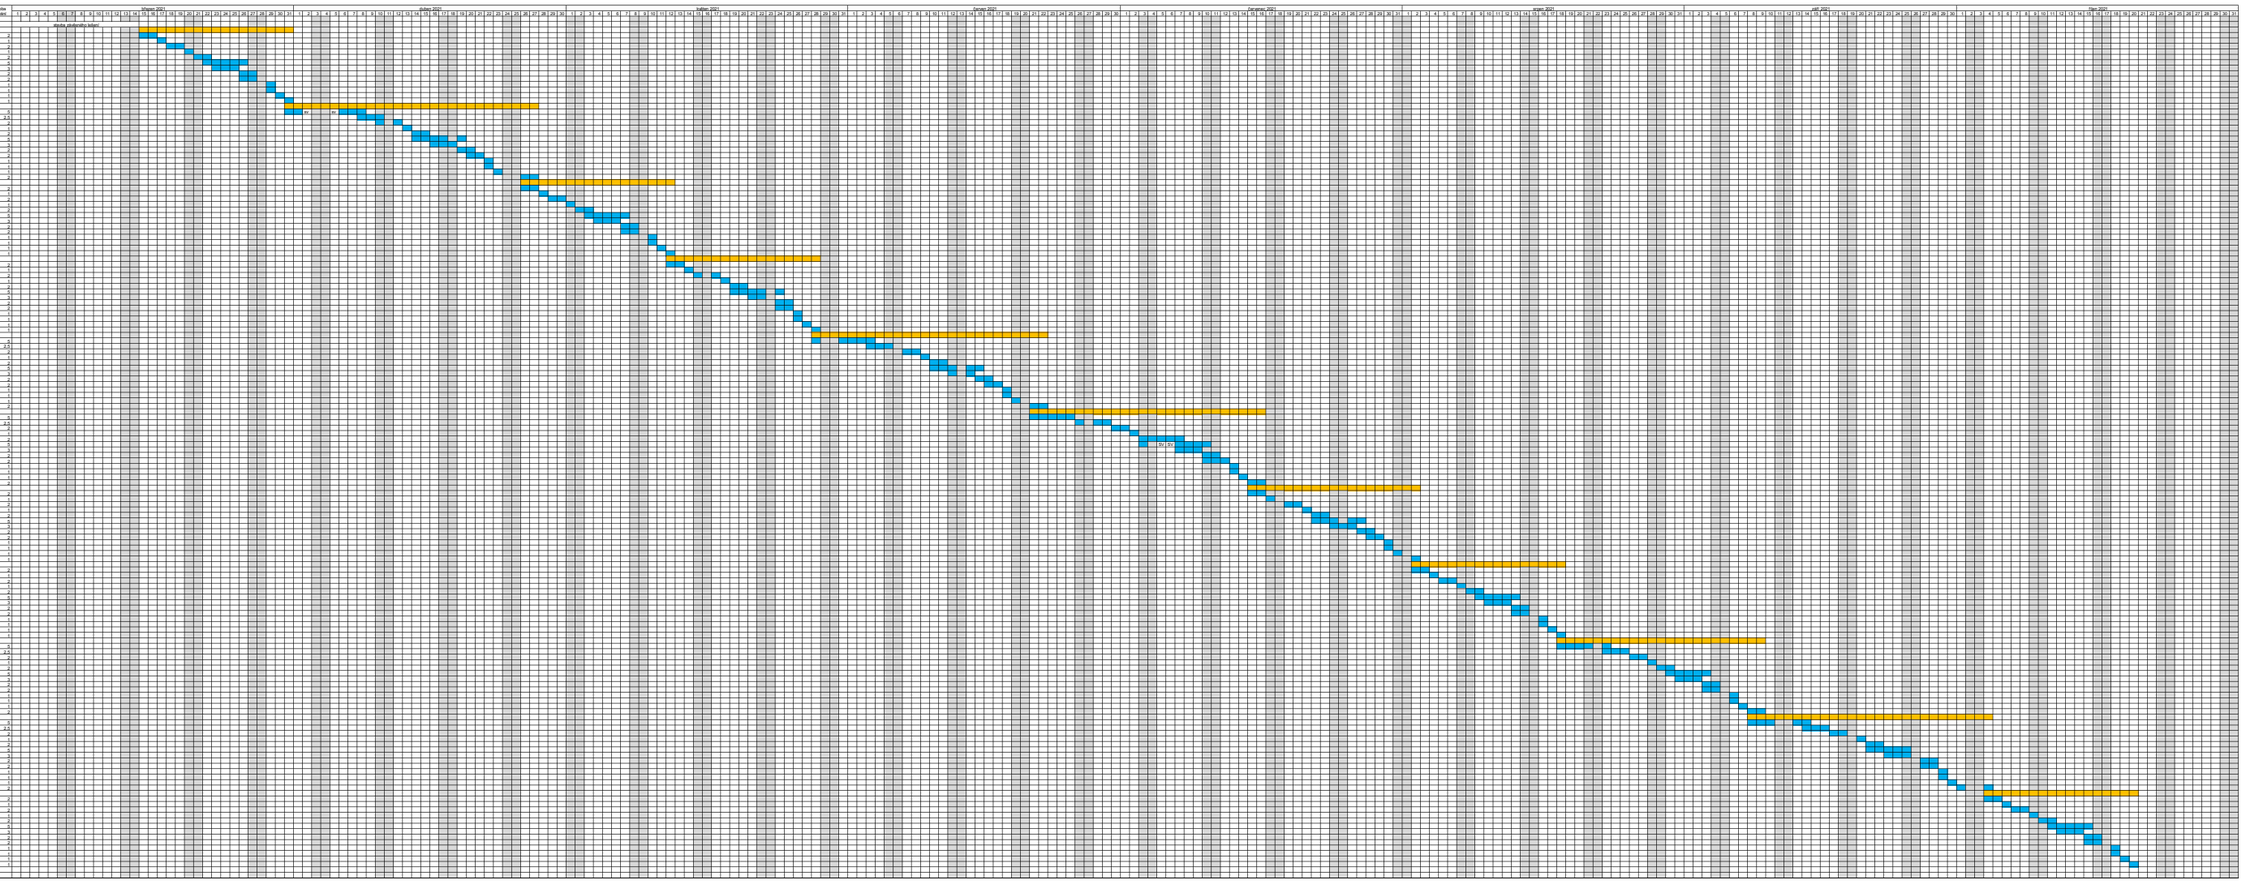
Základní text	Název	délka (měsíc)
	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ	
	Zlepšení zázemí, přístrešky, zastávky prostoru a kancelář v S. NP objektu B - Zemědělská kolej	
	doba zhotovitele (měsíc)	
1	**Kontejner C, E, G 2**	
	montáž kotevní	2
	odbourání hlav v dpmu	2,5
	bednění hlav v zdivu	2
	betonáž hlav Středníram	1
	technologická přestávka + odbednění	2
	Zděný + opravy atyka komínu	3
	zafalcení hlav + technologická přestávka	3
	rozbednění + odebírání hlav	2
	aplikování atyka komínu	2
	sádr. Penetrace SHR 100 - hlavy	1
	sádr. hydroizolačním nátěrem + proti mechu	1
	demontáž + tmel	1
	demontáž lešení	1
2	**Kontejner D 2, 6, 9A**	
	montáž kotevní	5
	odbourání hlav v dpmu	2,5
	bednění hlav v zdivu	2
	betonáž hlav Středníram	1
	technologická přestávka + odbednění	2
	Zděný + opravy atyka komínu	3
	zafalcení hlav + technologická přestávka	3
	rozbednění + odebírání hlav	2
	aplikování atyka komínu	2
	sádr. Penetrace SHR 100 - hlavy	1
	sádr. hydroizolačním nátěrem + proti mechu	1
	demontáž + tmel	1
	demontáž lešení	1
3	**Kontejner B, 9B, 11, 12**	
	montáž kotevní	5
	odbourání hlav v dpmu	2,5
	bednění hlav v zdivu	2
	betonáž hlav Středníram	1
	technologická přestávka + odbednění	2
	Zděný + opravy atyka komínu	3
	zafalcení hlav + technologická přestávka	3
	rozbednění + odebírání hlav	2
	aplikování atyka komínu	2
	sádr. Penetrace SHR 100 - hlavy	1
	sádr. hydroizolačním nátěrem + proti mechu	1
	demontáž + tmel	1
	demontáž lešení	1
4	**Kontejner 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9A, 9B, 10, 13A, 13B, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31**	
	montáž kotevní	5
	odbourání hlav v dpmu	2,5
	bednění hlav v zdivu	2
	betonáž hlav Středníram	1
	technologická přestávka + odbednění	2
	Zděný + opravy atyka komínu	3
	zafalcení hlav + technologická přestávka	3
	rozbednění + odebírání hlav	2
	aplikování atyka komínu	2
	sádr. Penetrace SHR 100 - hlavy	1
	sádr. hydroizolačním nátěrem + proti mechu	1
	demontáž + tmel	1
	demontáž lešení	1
5	**Kontejner 2, 6, 9A, 9B, 11, 12, 13A, 13B, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31**	
	montáž kotevní	5
	odbourání hlav v dpmu	2,5
	bednění hlav v zdivu	2
	betonáž hlav Středníram	1
	technologická přestávka + odbednění	2
	Zděný + opravy atyka komínu	3
	zafalcení hlav + technologická přestávka	3
	rozbednění + odebírání hlav	2
	aplikování atyka komínu	2
	sádr. Penetrace SHR 100 - hlavy	1
	sádr. hydroizolačním nátěrem + proti mechu	1
	demontáž + tmel	1
	demontáž lešení	1
6	**Kontejner 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9A, 9B, 10, 13A, 13B, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31**	
	montáž kotevní	5
	odbourání hlav v dpmu	2,5
	bednění hlav v zdivu	2
	betonáž hlav Středníram	1
	technologická přestávka + odbednění	2
	Zděný + opravy atyka komínu	3
	zafalcení hlav + technologická přestávka	3
	rozbednění + odebírání hlav	2
	aplikování atyka komínu	2
	sádr. Penetrace SHR 100 - hlavy	1
	sádr. hydroizolačním nátěrem + proti mechu	1
	demontáž + tmel	1
	demontáž lešení	1
7	**Kontejner 2, 6, 9A, 9B, 11, 12**	
	montáž kotevní	5
	odbourání hlav v dpmu	2,5
	bednění hlav v zdivu	2
	betonáž hlav Středníram	1
	technologická přestávka + odbednění	2
	Zděný + opravy atyka komínu	3
	zafalcení hlav + technologická přestávka	3
	rozbednění + odebírání hlav	2
	aplikování atyka komínu	2
	sádr. Penetrace SHR 100 - hlavy	1
	sádr. hydroizolačním nátěrem + proti mechu	1
	demontáž + tmel	1
	demontáž lešení	1
8	**Kontejner 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9A, 9B, 10**	
	montáž kotevní	5
	odbourání hlav v dpmu	2,5
	bednění hlav v zdivu	2
	betonáž hlav Středníram	1
	technologická přestávka + odbednění	2
	Zděný + opravy atyka komínu	3
	zafalcení hlav + technologická přestávka	3
	rozbednění + odebírání hlav	2
	aplikování atyka komínu	2
	sádr. Penetrace SHR 100 - hlavy	1
	sádr. hydroizolačním nátěrem + proti mechu	1
	demontáž + tmel	1
	demontáž lešení	1
9	**Kontejner 2, 27, 28, 29A**	
	montáž kotevní	5
	odbourání hlav v dpmu	2,5
	bednění hlav v zdivu	2
	betonáž hlav Středníram	1
	technologická přestávka + odbednění	2
	Zděný + opravy atyka komínu	3
	zafalcení hlav + technologická přestávka	3
	rozbednění + odebírání hlav	2
	aplikování atyka komínu	2
	sádr. Penetrace SHR 100 - hlavy	1
	sádr. hydroizolačním nátěrem + proti mechu	1
	demontáž + tmel	1
	demontáž lešení	1
10	**Kontejner 2, 29A, 31A**	
	montáž kotevní	5
	odbourání hlav v dpmu	2,5
	bednění hlav v zdivu	2
	betonáž hlav Středníram	1
	technologická přestávka + odbednění	2
	Zděný + opravy atyka komínu	3
	zafalcení hlav + technologická přestávka	3
	rozbednění + odebírání hlav	2
	aplikování atyka komínu	2
	sádr. Penetrace SHR 100 - hlavy	1
	sádr. hydroizolačním nátěrem + proti mechu	1
	demontáž + tmel	1
	demontáž lešení	1
11	**Kontejner 2, nosníky**	
	montáž kotevní	5
	odbourání hlav v dpmu	2,5
	bednění hlav v zdivu	2
	betonáž hlav Středníram	1
	technologická přestávka + odbednění	2
	Zděný + opravy atyka komínu	3
	zafalcení hlav + technologická přestávka	3
	rozbednění + odebírání hlav	2
	aplikování atyka komínu	2
	sádr. Penetrace SHR 100 - hlavy	1
	sádr. hydroizolačním nátěrem + proti mechu	1
	demontáž + tmel	1
	demontáž lešení	1
FN	Fasádní základ	
CN	Chladící nádoba
